



Arasement du Moulin d'Artois



L'Authie
Auxi-le-Château



Liste 2
Code ROE
9508



10 JOURS
Début des travaux
15/09/2018



18660€
70% (13062€) AEAP
30% (5598€) Région



Avant Travaux

Contexte

- Ouvrage : portique de vannes et bajoyer ;
- Il favorisait la création d'embâcles et les débordements latéraux ;
- Colmatage des zones de fraie en amont.



Pendant Travaux

Objectifs

- Solutions techniques retenues :
 - Arasement du portique de vannes ;
 - Démontage partiel du bajoyer ;
- Réduction du risque d'inondation ;
- Limiter le colmatage des frayères en amont.



Après Travaux

Gains écologiques attendus

- Améliorer les capacités d'accueil et de production de l'Authie ;
- Retrouver une efficacité de reproduction sur les frayères situées à l'amont immédiat de l'ouvrage ;
- Amélioration de l'hydraulicité locale.

TRAVAUX




Maitre d'ouvrage
FDAAPPM62



Maitre d'œuvre
FDAAPPM62



Entreprise
Forêts et Paysages

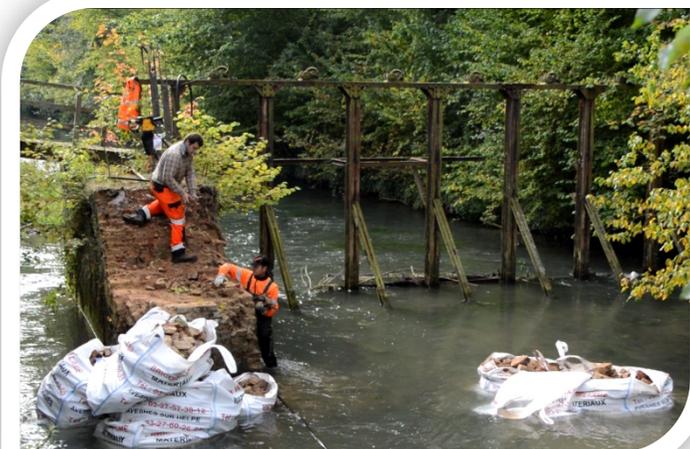

Arasement du bajoyer en briques



Découpe du portique de vannes



Exportation des déblais



Etat initial avant réalisation des
travaux



Etat final après les travaux
